Project Initiating

WI2022 Manajemen Proyek (IF)

Sem 2 2025/2026

Adi Mulyanto
Yani Widyani
Wikan Danar S
M.R.Al-Ghazali

TREY research

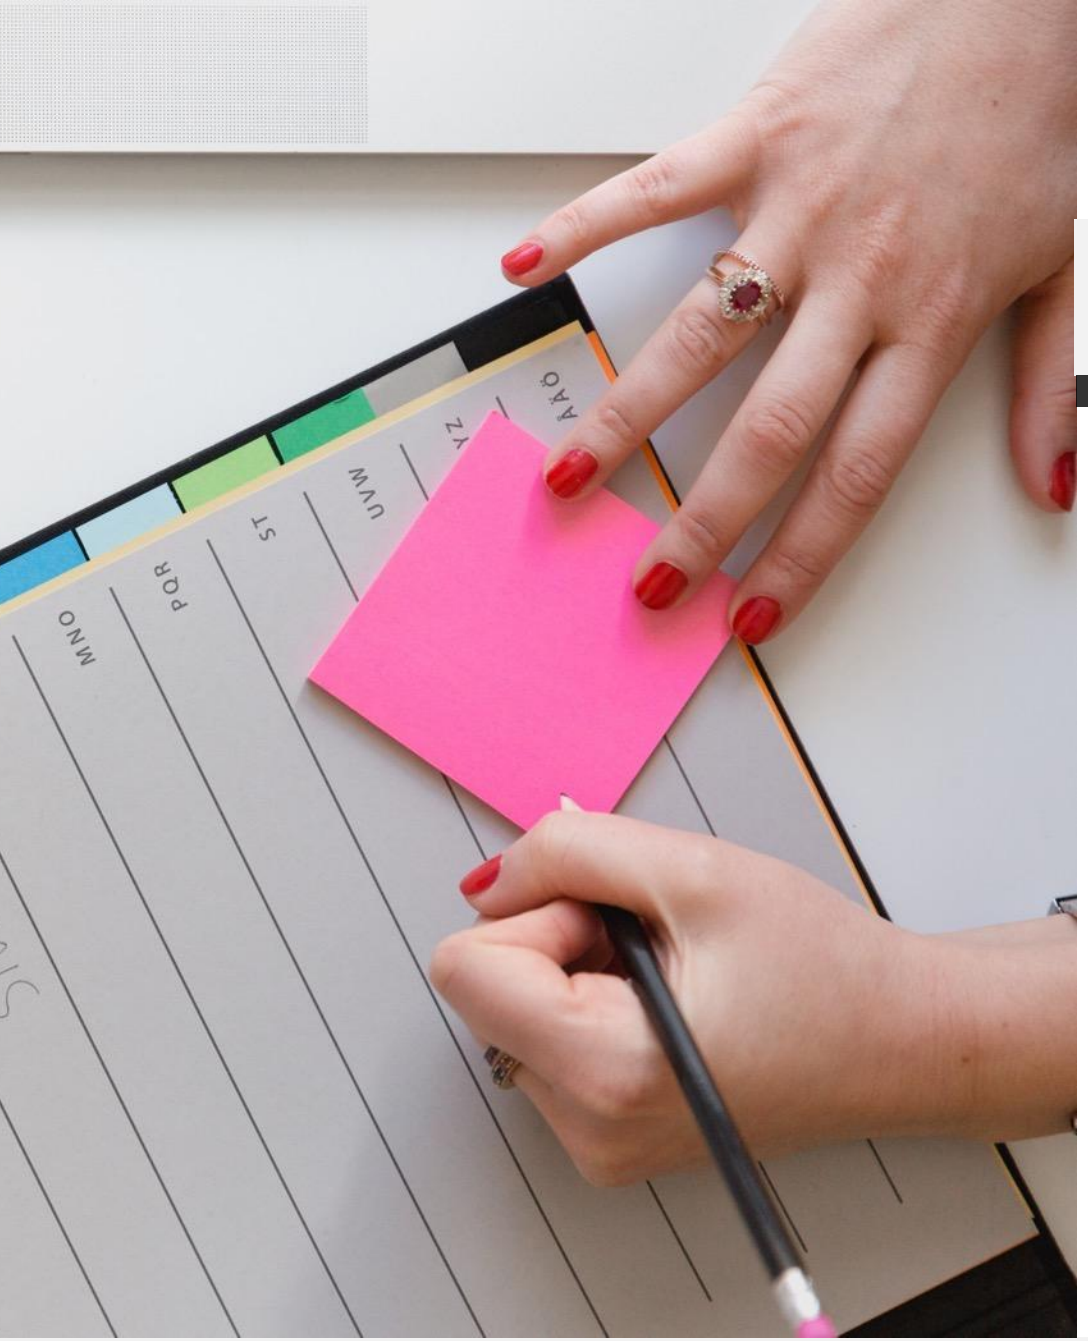

Inisiasi Proyek

- Inisiasi sebuah proyek termasuk **mengenali** dan **memulai** proyek baru.
- Beberapa organisasi menggunakan fase **pra-inisiasi,** sementara yang lain menyertakan item seperti pengembangan **business case** sebagai bagian dari **inisiasi**
- Tujuan utamanya adalah memilih dan memulai proyek secara resmi
- Output utama meliputi:
  - Penugasan manajer proyek
  - Identifikasi stakeholder utama
  - Business case
  - Project charter yang telah ditandatangani

a. Fase Pra-Inisiasi

Project Initiating

(a) Fase Pra-Inisiasi

Mencakup Aktivitas:

- Penentuan batasan scope, time, dan cost proyek.
- Identifikasi project sponsor.
- Memilih project manager.
- Mengembangkan business case.
- Mengkaji proses dan harapan untuk mengelola proyek oleh project manager.
- Menentukan apakah proyek harus dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih kecil.

Business Case

- Definisi: analisis nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko rencana proyek
- Atribut Business case:
  - Rincian semua kemungkinan dampak, biaya, manfaat
  - Perbandingan alternatif yang jelas
  - Informasi terkait yang obyektif
  - Ringkasan temuan yang sistematis

Business Case (1)

Berisi:

- **Latar belakang (Introduction/background)**
  - deskripsi lingkup organisasi tempat akan digunakannya P/L hasil proyek serta perlunya proyek P/L ini dilaksanakan
- **Tujuan Bisnis (Business Objective)**
  - dampak terhadap tujuan organisasi yang dapat diperoleh bila P/L hasil proyek dimanfaatkan/ digunakan. Termasuk 'kualitas' yang diharapkan dari P/L, contoh: *"meningkatkan produktifitas…."*, *"melakukan efisiensi …."*, *"memperluas pasar …"*, dsb
- **Situasi saat ini dan persoalan/peluang (Current Situation and Problem/Opportunity Statement)**
  - kondisi saat ini, termasuk kondisi sistem atau P/L yang berjalan saat ini, hingga kesempatan dan masalah yang mungkin timbul pada saat P/L dibangun
- **Asumsi dan Batasan (Critical assumption and constraints)**
  - asumsi dan batasan yang diperlukan agar proyek P/L ini bisa berjalan serta hambatan-hambatan yang mungkin muncul

Business Case (2)

Berisi:

- **Analisa Alternatif dan Rekomendasi (Analysis of Options and Recommendation)**
  - analisis pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan, termasuk rekomendasi yang dapat diberikan, contoh *"membangun dari awal…", "mengembangkan P/L yang sudah ada…", "menyesuaikan (customize) paket aplikasi"*, dsb
- **Kebutuhan Awal Proyek (Preliminary Project Requirements)**
  - kebutuhan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu agar proyek P/L ini dapat berjalan
- **Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan (Budget Estimate and Financial Analysis)**
  - estimasi biaya proyek P/L, ~~lebih baik jika dilengkapi analisis finansial (*opsional*)~~
- **Perkiraan Jadwal (Schedule Estimate)**
  - rencana jadwal (terkait waktu) pelaksanaan proyek P/L
- **Resiko (Potential Risks)**
  - Resiko-risiko yang mungkin timbul selama pembangunan P/L
- ~~**Exhibits** (*opsional*)~~
  - ~~tabel rangkuman dari rencana biaya/jadwal~~

b. Fase Inisiasi

Project Initiating

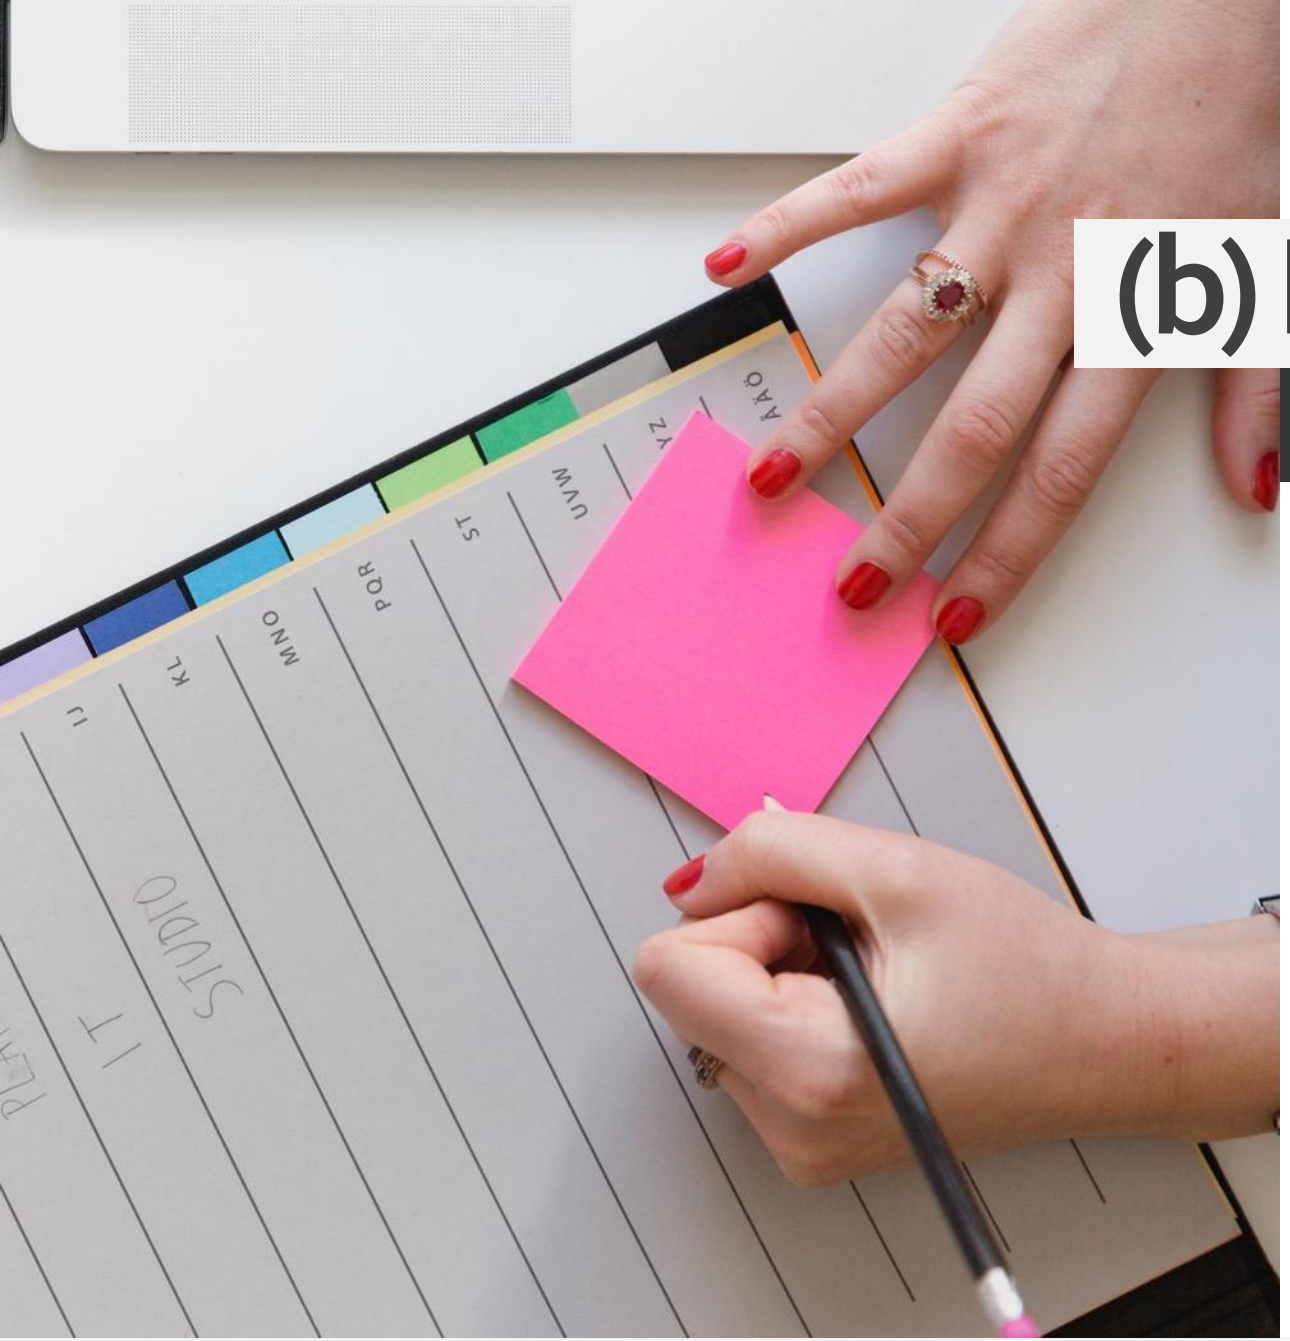

(b) Fase Inisiasi

Mencakup Aktivitas:

- Untuk secara resmi memulai suatu proyek. Perlu melakukan:
  - identifikasi stakeholder
  - mengembangkan project charter
- Aktivitas tambahan yang sangat berguna untuk memulai proyek adalah:
  - menyusun strategi manajemen stakeholder
  - Melaksanakan formal project kick-off meeting (pertemuan pembukaan proyek formal).
- Tidak semua project charter, daftar stakeholder, dan output lainnya akan sama, karena setiap proyek dan organisasi adalah unik.

Identifikasi Stakeholder

- Identifikasi stakeholder dengan jelas adalah penting untuk membuat Project Charter.
  - Project Charter harus singkat (1-2 hal)
  - Dapat merujuk ke dokumen lain
  - Stakeholder harus setuju dengan project charter.
    - Dapatkan tanda tangan mereka!
    - Bergabung dengan proyek dapat mengganggu tugas normal mereka
  - Perlu dipertimbangkan semua kemungkinan, dan menangani semua kekhawatiran para stakeholder
- Project Manager akan mengembangkan:
  - Daftar stakeholder
  - Strategi manajemen stakeholder

Stakeholder

Daftar Stakeholder

Bentuk tabel, dengan kolom atribut:

- Nama personal
- Posisi pada organisasi
- Catatan: internal atau eksternal
- Peran dalam proyek
- Alamat kontak

Strategi Manajemen Stakeholder

Bentuk tabel, dengan kolom atribut:

- Nama personal
- Tingkat minat
- Tingkat pengaruh
- Strategi manajemen potensial

Project Charter

- Project charter adalah dokumen yang **secara resmi mengakui keberadaan suatu proyek**. Menjelaskan produk yang akan dideliver dan memenuhi kebutuhan bisnis proyek.
- Project Charter:
  - Berasal dari **"luar"** tim proyek dan mendefinisikan proyek.
  - **Tidak berubah** selama proyek berlangsung
- Project charter harus SMART:
  - Specific
  - Measurable
  - Achievable
  - Realistic
  - Time-specific

Project Charter

Berisi:

Nama Proyek (Project Title): <nama proyek>

Waktu Mulai (Project Start Date): <tanggal mulai>

Waktu Akhir (Projected Finish Date): <tanggal akhir>

Informasi Biaya (Budget Information): <informasi biaya>

Nama Manajer Proyek (Project Manager): <nama dan informasi manajer proyeknya>

Tujuan Proyek (Project Objectives): <jelaskan tujuan proyek>

Kriteria sukses (Main Project Success Criterion): <apa kriteria sukses dari proyek>

Pendekatan (Approach):<jelaskan pendekatan yang dilakukan>

Tugas dan Tanggung jawab (Roles and responsibilities): <jelaskan tugas dan tanggung jawab setiap person yang terlibat dalam proyek>

Kick-off Meeting

Kick-off Meeting

- Project Kick-off meeting adalah pertemuan yang diadakan di awal proyek agar stakeholder
  - dapat bertemu satu dengan lain,
  - mereview tujuan proyek, dan
  - mendiskusikan rencana ke depan.
- Dilaksanakan setelah business case dan project charter diselesaikan, walaupun bisa sebelumnya sesuai permintaan stakeholder.

Agenda Kick-off Meeting

- Topik utama agenda Kick-off Meeting proyek:
  - Tujuan pertemuan
  - Agenda (daftar dalam urutan topik yang akan dibahas)
  - Sesi pendokumentasian item aktivitas, pelaksana, dan waktu penyelesaian aktivitas
  - Sesi pendokumentasian waktu pertemuan berikutnya
- Mengirimkan notulen pendokumentasian hasil rapat kepada semua peserta rapat dan stakeholder terkait segera setelah selesai rapat

WI2022 ManPro Sem 2 2025/2026

Adi Mulyanto
Yani Widyani
Wikan Danar Sunendyo
Muh. Romadon Al-Ghazali

TREY research
